

11 mei 2022

Projecttijdlijn

*Het project Herinrichting Kruislaan, Fortweg,
Raadhuislaan in de tijd*



gemeente
Haarlemmermeer

Projecttijdlijn

- Overzicht van project Herstraten Kruislaan, Fortweg, Raadhuislaan in de tijd
- Waar mogelijk inclusief redenen vertraging

Tijdslijn 2012 - 2019



- 
- 2012
 - Wens tot onderhoud voor het eerst gemeld vanuit bewoners
 - 2015
 - Tijdens een regulier overleg tussen Buurtvereniging Het Oude Buurtje (HOB) en Gebiedsmanagement (GM) is de bestrating voor het eerst ter sprake gekomen
 - 2018
 - Intern overleg Beheer & Onderhoud (B&O): Alleen herstraten, start uitvoering 2019
 - 2019 (begin)
 - Intern overleg gemeente: Herinrichten door werk met werk te combineren. (projectleider Jack Smit)
 - 2019 (1 juni en juli)
 - Overleg tussen HOB en gemeente: Start uitvoering september 2020

Tijdslijn 2019 - 2020


- 
- 2019 (oktober/november)
 - Toezegging organiseren bewonersbijeenkomst niet nagekomen
 - 2020 (januari)
 - Nieuwe projectleider (Mohamed Hamidi)
 - 2020 (7 april)
 - E-mail naar HOB: De coronamaatregelen hebben geen invloed op de voorbereiding van de herinrichting Fortweg, Raadhuislaan en Kruislaan.
 - Uitvoering eind 3e kwartaal of begin 4e kwartaal 2020.
 - 2020 (15 april)
 - Nieuwe projectleider (Harko Pilot)
 - Constatie dat bestaande ontwerp niet aan de ontwerpvoorwaarden voldoet.

Tijdlijn 2020

- 2020 (16 juni)
 - Eerste overleg klankbordgroep onder nieuwe projectleider
 - Oorspronkelijke ontwerp voldoet niet aan richtlijnen. Nieuwe richting aangegeven

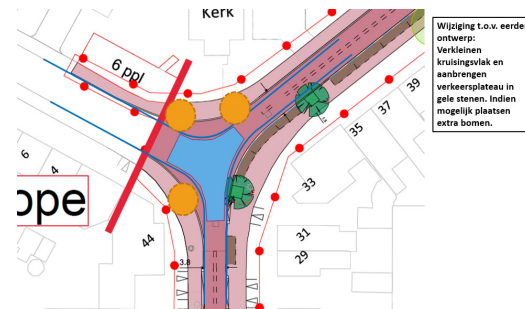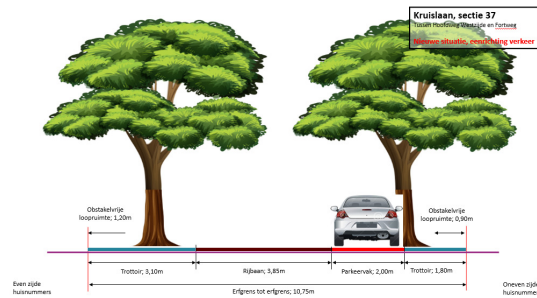

- 2020 (27 augustus)
 - Overleg met klankbordgroep
 - Update stand van zaken inclusief tekening adviesbureau en mogelijke bomen

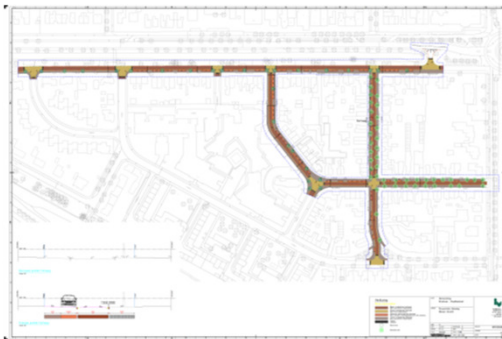

Tijdslijn 2020

- 2020 (22 oktober)
 - Overleg met klankbordgroep
 - Stand van zaken
 - Voorbespreken digitale inloopperiode



Kruislaan



Kruislaan

Kruislaan

Boom: Tilia flavescens 'Glenleven' (Linde)
1e grootte (>15m)

Beplanting: Hypericum inodorum 'Black Gem'
(boomvak 2x2m)
Potentilla fruticosa 'Living
Daylight' (boomvak > 2x2m)



Kruislaan bij de kerk

Boom: Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
(Valse Christusdoorn)
2e grootte (8-15m)

Beplanting: Buddlejia free petite Lavender 'Flow'
Buddlejia davidii 'White Profusion'



- 2020 (23 november – 6 december)
 - Digitaal participeren



Tijdlĳn 2021

- 2021 (11 maart)
 - Overleg met klankbordgroep
 - Stand van zaken
 - Resultaten inspraak
 - Wijzigingen naar aanleiding van inspraak (vooral Fortweg)



Wijzigingen t.o.v. ter inzage gelegde ontwerp

- **Kruislaan**
 - Verschuiven twee bomen ter hoogte van Kruislaan 51 – 53
 - Verwijderen 1 parkeerplaats voor een bestaande inrit
- **Fortweg**
 - Verschuiven rijbaan noordelijke deel in westelijke richting om aan Oostzijde extra parkeerplaatsen te realiseren.
 - Parkeerplaats T.h.v. Fortweg 15 vervallen
 - Herontwerp zuidelijke deel i.v.m. onmogelijke draai vuilniswagen naar inrit woningen 28 – 34
 - Gaat ten koste van twee nieuwe bomen die we niet kunnen planten en 1 parkeerplaats
- **Raadhuislaan**
 - Parkeerplaats ter hoogte van Raadhuislaan 24 vervallen i.v.m. heropenen inrit, groenperk aangepast naar stabilizer
 - T.h.v. Raadhuislaan 7 – 8 inrijdmogelijkheden geoptimaliseerd door parkeerplaats en boom iets te verschuiven
 - Afwatering openbare ruimte naar berm i.p.v. naar hemelwater afvoer, vanwege klimaatadaptief inrichten

- 2021 (zomer/najaar)
 - Aanvullende opbrekberekeningen grondwater (zout water, tweede laag) en pompproef
 - Wijziging beleid inrichting groeiplaatsverbetering bomen heeft tot grote vertragingen andere projecten (Stationsweg en Parklaan/Draverslaan) geleid. Eerst daar uitzoeken voordat we ook hier in chaos belanden. Inclusief overleg daarover met nutspartijen.

Tijdslijn 2022

- 
- 2022 (februari/maart)
 - Definitief Ontwerp toets 2^e ronde uitgevoerd (zo goed als afgerond)
 - Opstellen tekeningen voor aannemer opgestart
 - Komende tijd:
 - Buurt informeren
 - Website aanpassen en definitieve tekeningen erop.

Planning

Maart - mei 2022	Opstellen tekeningen voor de aannemer
Mei - juli 2022	Nationaal openbare aanbesteding
Eind augustus 2022	Start voorbereiding aannemer
November 2022	Start werkzaamheden nutspartijen
Januari 2023	Start werkzaamheden civiele aannemer
Medio 2024	Werkzaamheden gereed
